

LIFE Baie de l'Aiguillon

Comité de pilotage 02

Mardi 07 mars 2017 > Coulon



1. Fiche d'identité du projet
2. Plan de financement
3. Etat d'avancement financier
4. Etat d'avancement technique
 - i. Action crassat
 - ii. Action Prée Mizottière
 - iii. Action Pointe de l'Aiguillon
 - iv. Etudes Anatidés et Eau
 - v. Sensibilisation et communication
 - vi. Coordination
5. Progress report
6. Calendrier



Fiche d'identité du projet

Contexte Milieux aux enjeux biologiques forts et soumis aux activités humaines et des phénomènes naturels importants

Objet « *Préservation, restauration et valorisation des habitats d'intérêt européen de la baie de l'Aiguillon* »

Durée 2016 – 2020

Coordinateur



Associés



Budget 2.317.727 €

Avec le soutien financier de



Fiche d'identité du projet



1. Baie de l'Aiguillon

- Restauration d'environ 100 ha de vasières



2. Prée Mizottière

- Restauration d'environ 10 ha de prés salés et 15 ha de prairies pâturées



3. Pointe de l'Aiguillon

- Protection de 12 ha de milieux dunaires



4. Etudes Interactions Baie/Marais

- Etude anatidés : Régime et ressource alimentaire, Distribution géographique
- Etude qualité eau : Effets qualité eau sur comportement biodiversité




Sensibilisation du public

- Outils : Exposition, ouvrage illustré richesses baie, etc.
- Trois séminaires : Submersion marine, conchyliculture, restitution finale




Fiche d'identité du projet

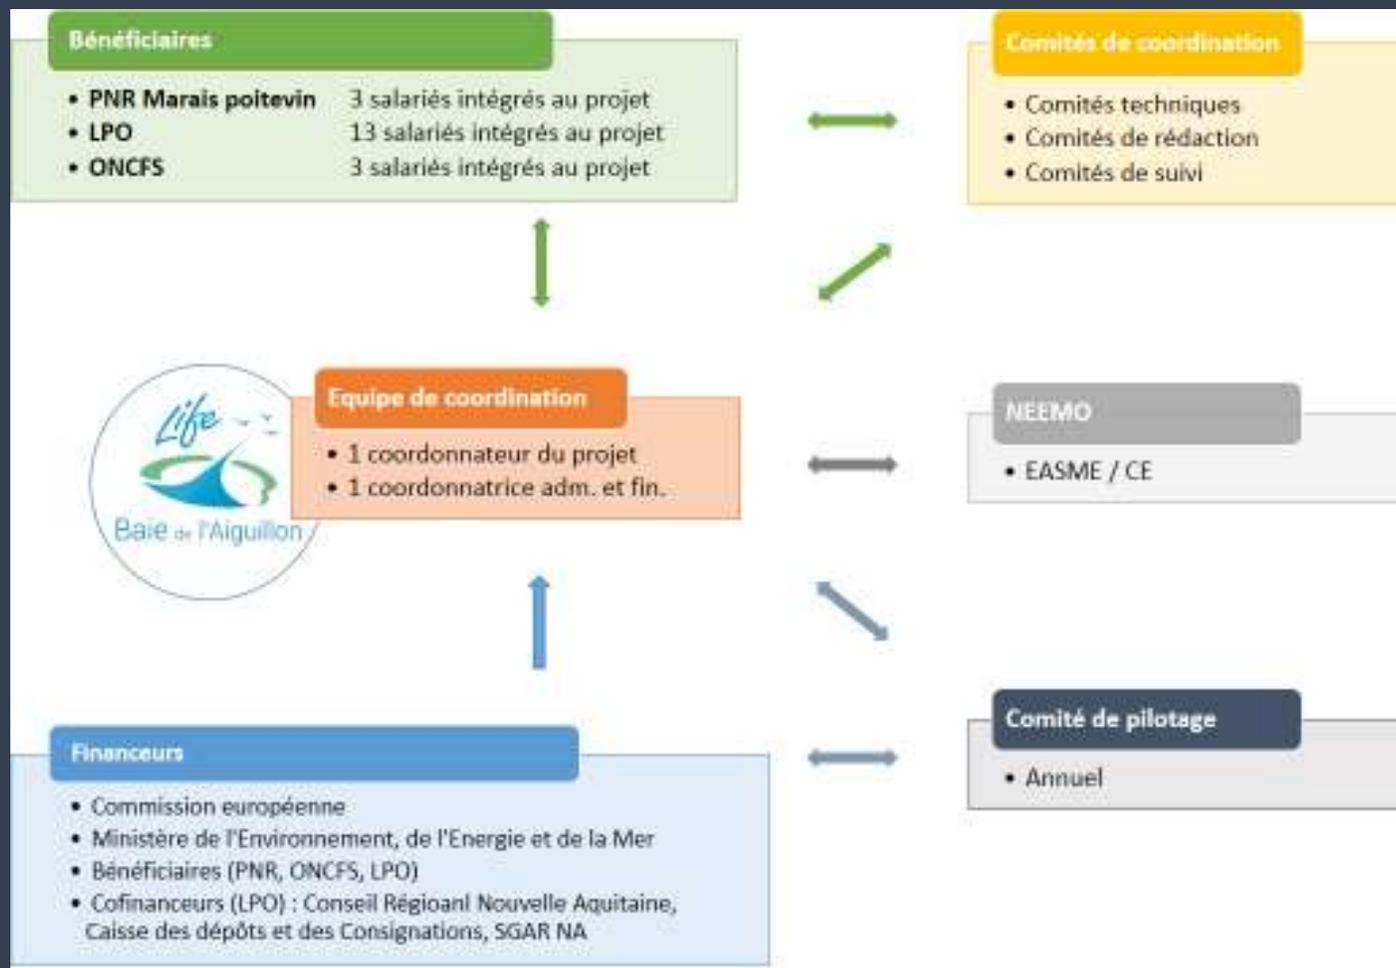

Plan de financement

Financement LIFE Baie de l'Aiguillon

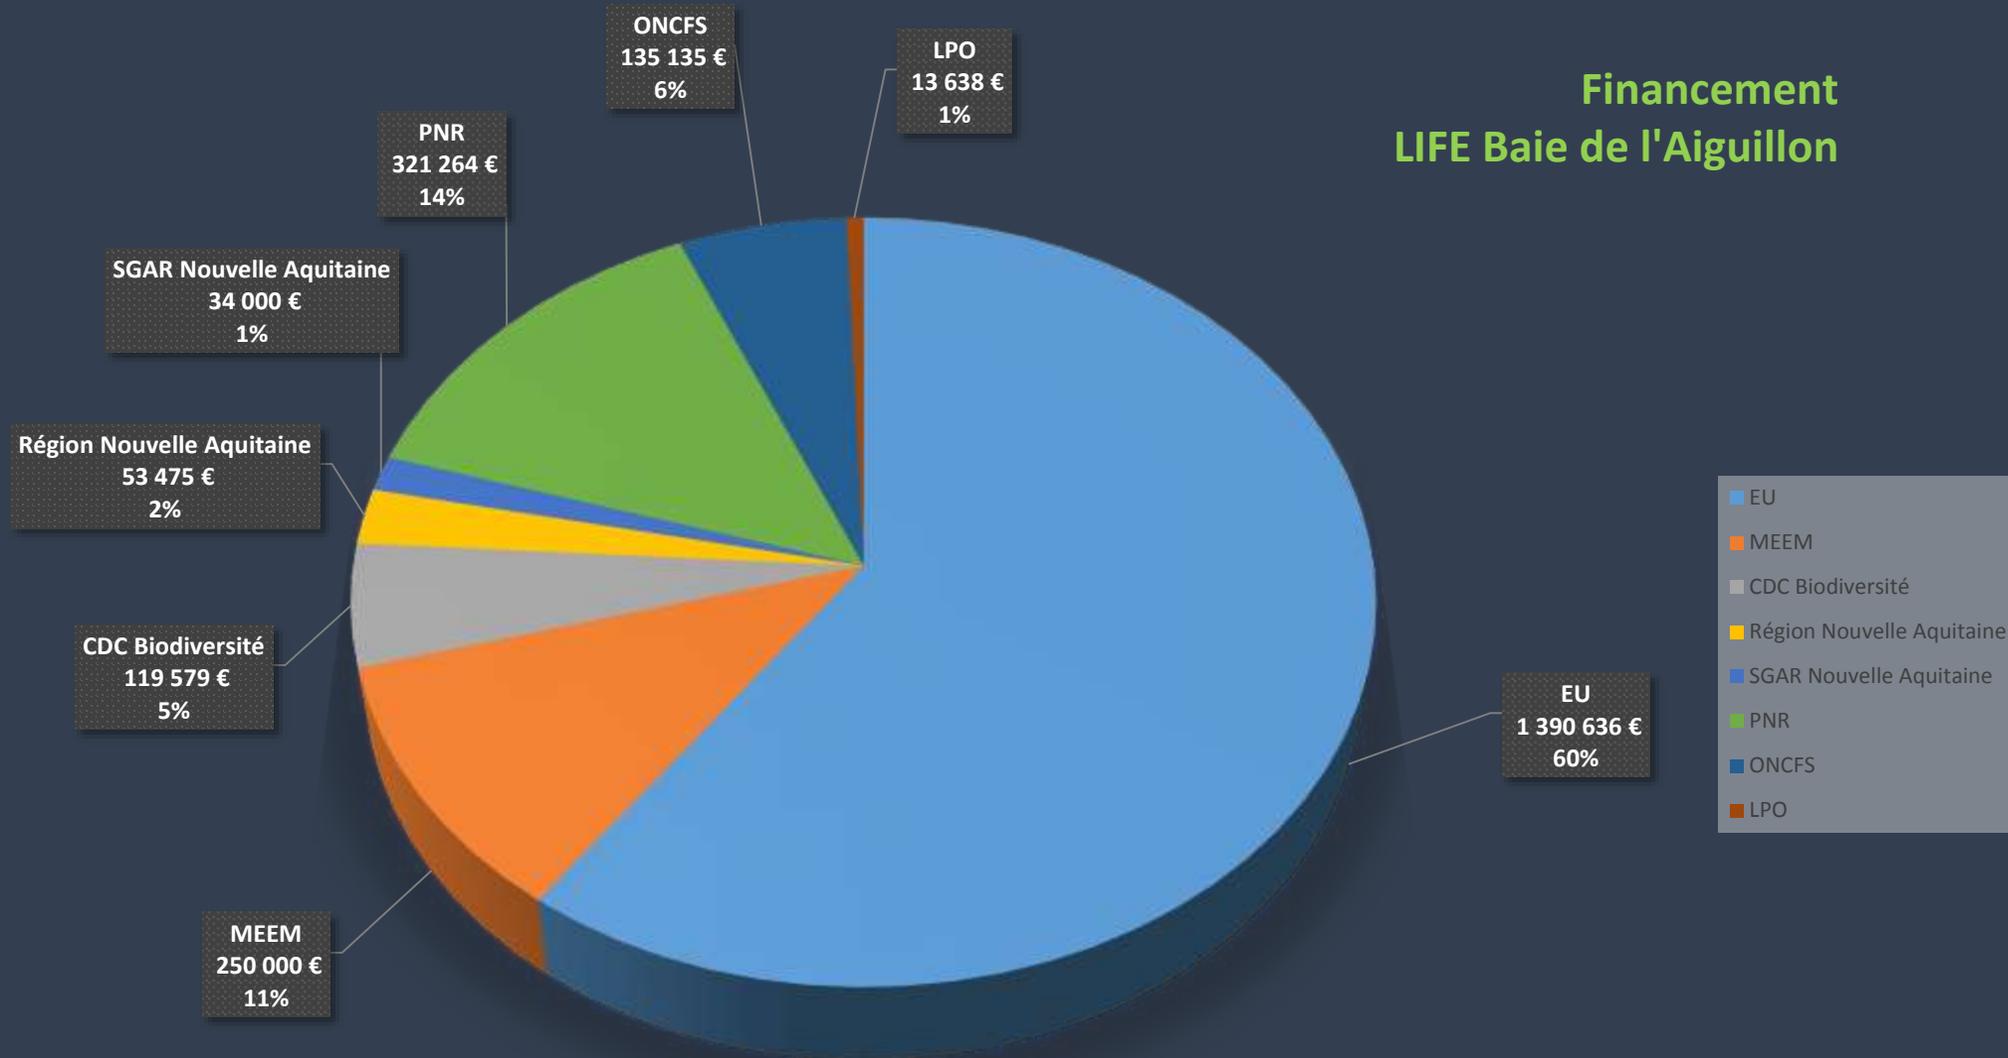

Etat d'avancement financier

2016				2017				2018				2019				2020							
1T	2T	3T	4T	1T	2T	3T	4T	1T	2T	3T	4T	1T	2T	3T	4T	1T	2T	3T	4T				
Progress report I				Progress report II				Midterm report				Progress report III				Final report							
COPIL 01				COPIL 02				COPIL 03				COPIL 04				COPIL 05				COPIL 06			

DÉPENSES ENGAGÉES
AU 01/03/2017

412 117 € 18%

DÉPENSES RÉALISÉES
AU 31/12/2016

177 698 € 8%


BUDGET INITIAL

2317 728 €

100%

Etat des dépenses

Dépenses engagées au 01 mars 2017 par volet d'actions

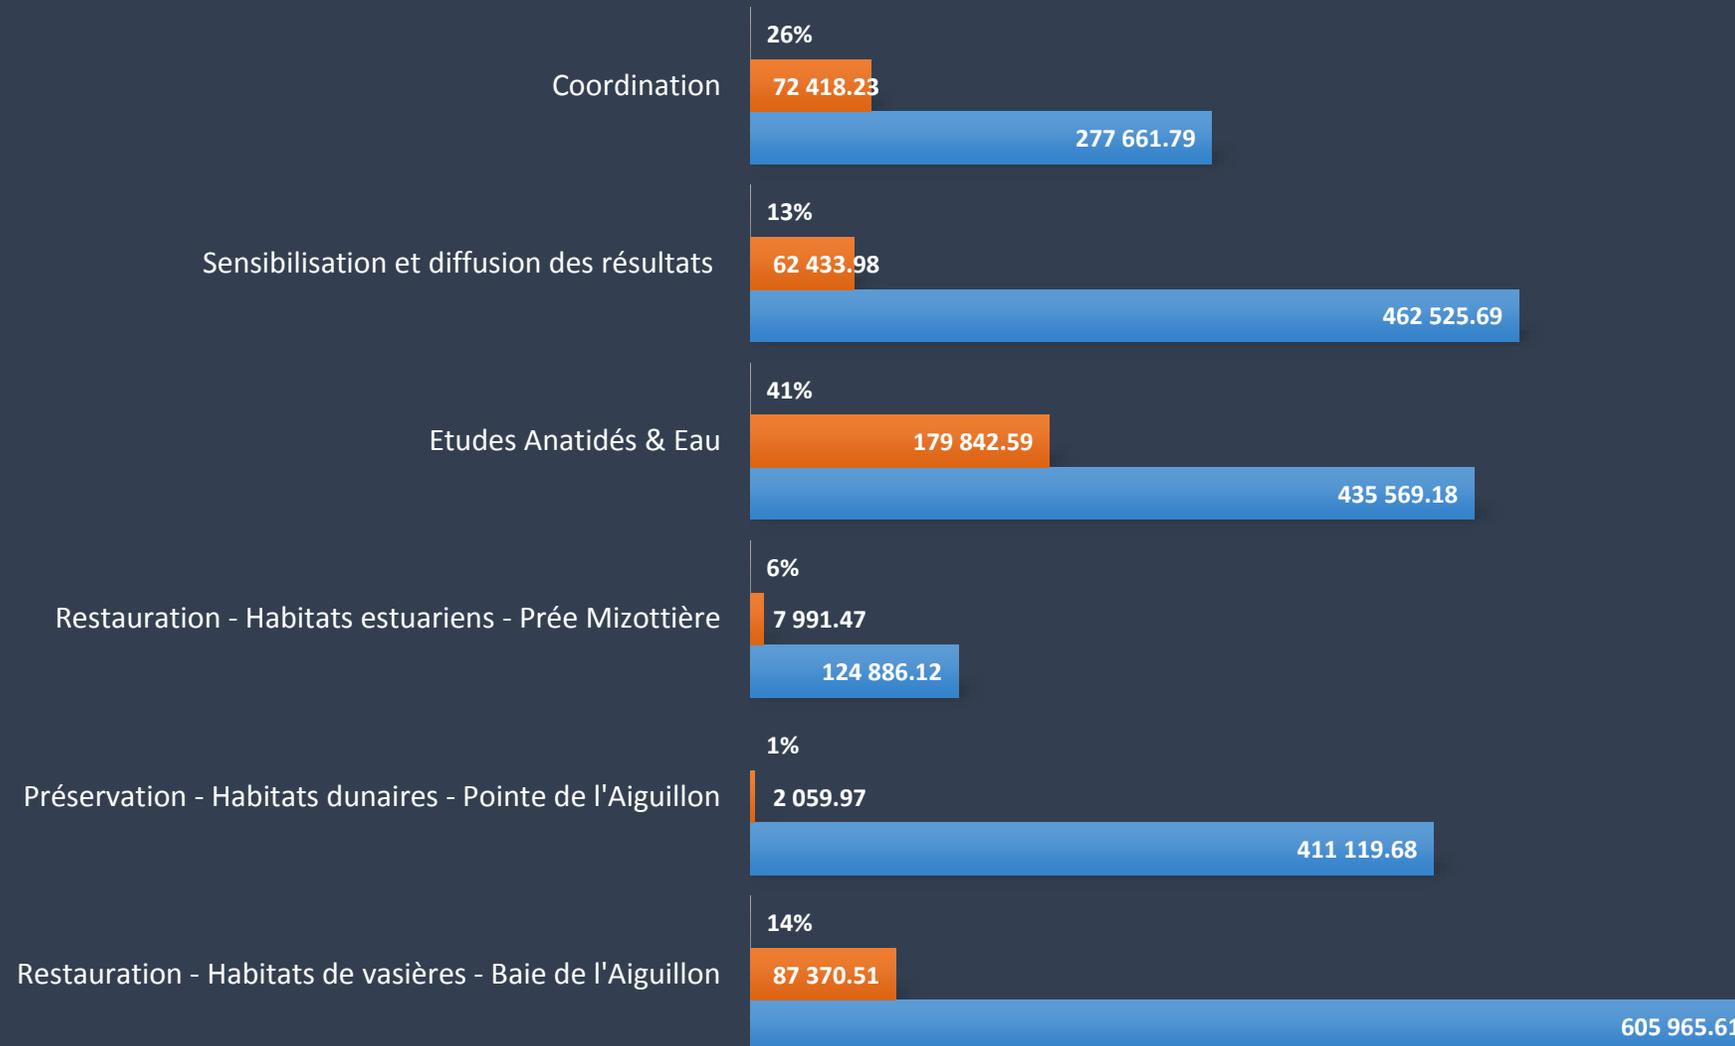

Action crassats

Action

Restauration des vasières et monitoring

Nomenclature Life

A1, C1, D1

Site

Baie de l'action

MO

LPO

Etat avancement

Conforme au calendrier initial



Action crassats

Travaux crassats



- Instructions réglementaires *Créocéan en cours* > Fin juin 2017
> 22 juin 2017
- Comité de suivi Crassats 02 > Eté 2017
- Consultation travaux > Automne 2017
- 1^{ère} tranche travaux

Monitoring

- Relevé topographique baie *OPSIA* > Réalisé en octobre 2016
- Cartographies réalisées > Réalisées en janvier 2017
- Analyse données topo *LIENSs en cours* > Fin décembre 2017 (évolution sédimentaire et interprétation)
- Inventaire faune benthique *J. Jourde en cours* > Fin décembre 2018
- NB : Lettre d'information crassats > Juillet 2017



Action crassats

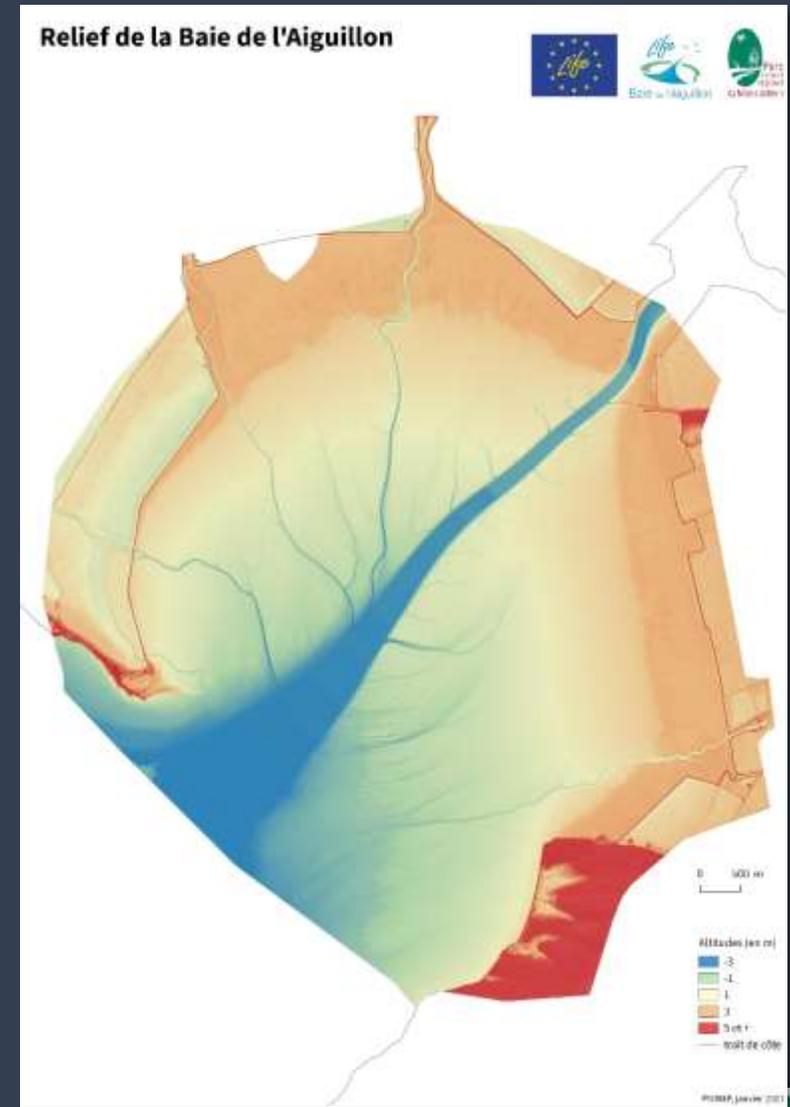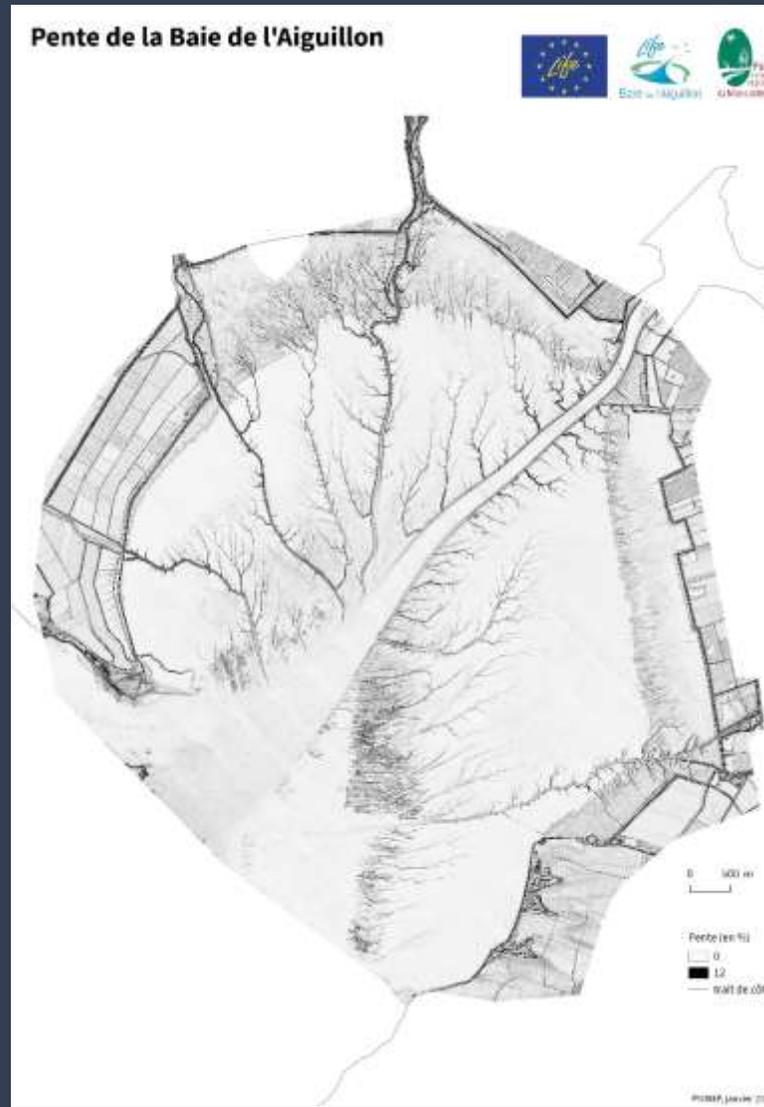

Action Restauration de prés salés, de prairies pâturées et monitoring

Nomenclature Life A3, C3, D3 et E7

Site Ferme de la Prée Mizottière

MO PNR

Etat avancement **Retard** / calendrier initial

Convention DMO CDL en cours > mai 2017

Déplacement digue

Aménagement plateforme observation

Aménagement ouvrages hydrauliques



Travaux Digue

Pylône digue RTE

1 > Déplacement digue et endiguement pylône (prise en charge Life ?)

2 > Déplacement pylône par RTE à moyen terme

Co-Maitrise d'ouvrage PNR SMVSA ?

1 > Avec SMVSA, si accord CDL – SMVSA

2 > Sans SMVSA, si calendriers incompatibles

Comité de suivi Prée Mizottière 02

Consultation (PNR ou SMVSA)

> 05 mai 2017

> à définir en comité de suivi

Prestation Etudes préalables

> à définir en comité de suivi

Prestation Travaux digue

> à définir en comité de suivi



Travaux d'aménagement d'une plateforme d'observation


- Position et forme ? > à définir en **Comité de suivi**
- Consultation > novembre 2017
- Etudes préalables > printemps 2018
- Travaux plateforme > été 2018

Travaux d'aménagement d'ouvrages hydrauliques

- Pas d'étude Loi sur Loi (DDTM85) > info automne 2016
- Consultation > novembre 2017
- Pose ouvrages > printemps 2018

Suivis biologiques

- Passereaux ONCFS > avril et mai 2016
- Amphibiens ONCFS > pré étude mars 2016
- Relevé floristique > 1/an

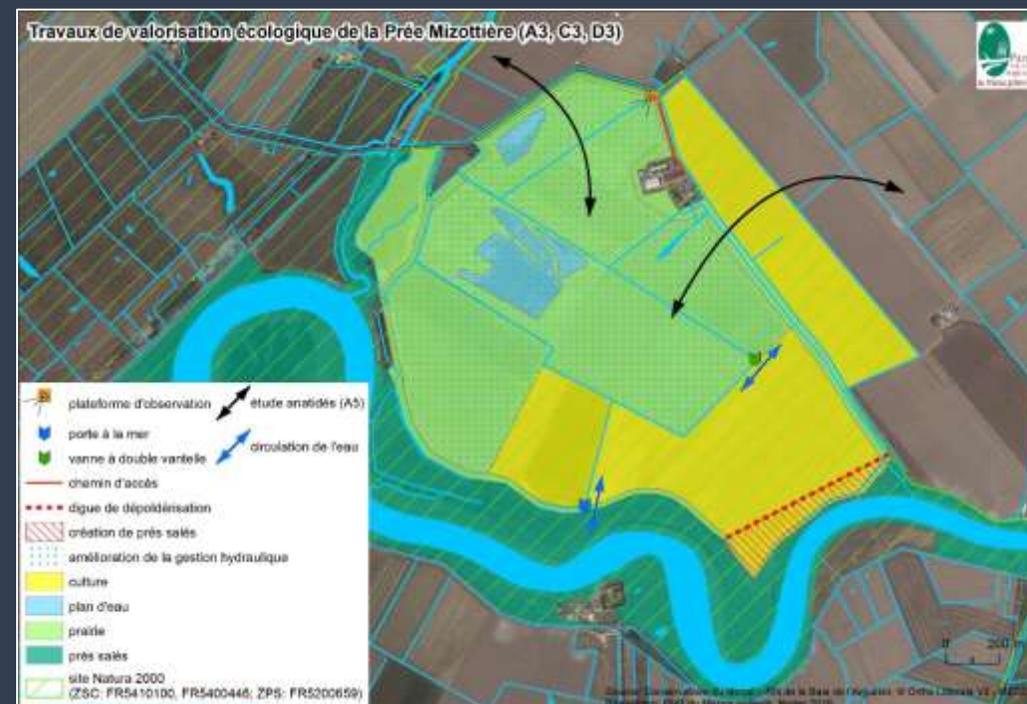


Action Pointe Aiguillon

Action	Préservation et restauration des milieux dunaires et monitoring
Nomenclature Life	A4,C4 et D4
Site	Pointe de l'Aiguillon (APPB)
MO	PNR
Etat avancement	Conforme au calendrier initial



Etude de fréquentation touristique

> été 2016, synthèse en cours de rédaction

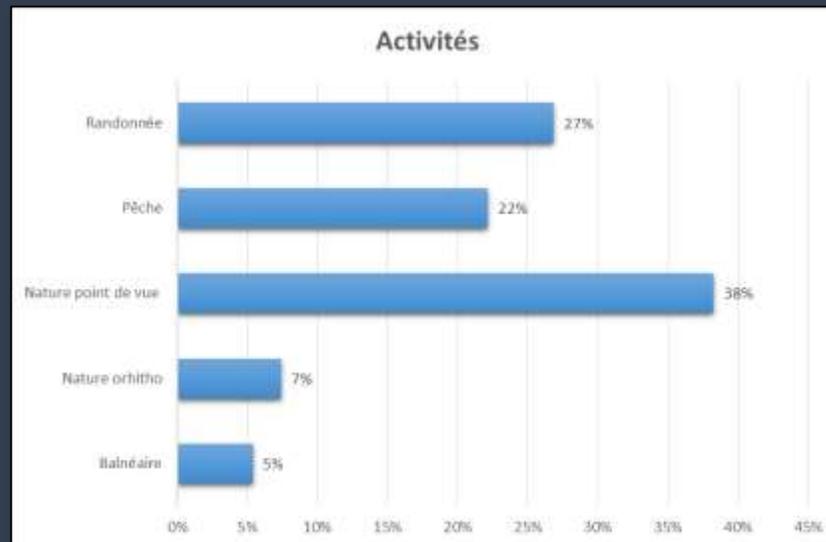

Enquête sur la fréquentation Touristique de la pointe de l'aiguillon

1. Pourquoi es-tu allé(e) de, en été ou à l'automne dans la cadre d'un programme ou lors d'un week-end ou vacances en été de la pointe de l'aiguillon. Tu es allé(e) seule ou en famille avec lequel? quel les autres participants sont vos autres? La question est de quel genre? Pour quelle information aide de comprendre l'impact de ce regard de quel côté? Pour la faire des aménagements pour préserver le site et améliorer le point de vue touristique.

Date: _____ Sexe: _____

2. Quel est ton âge? (à compléter avec un chiffre)

3. Quelle est ta profession? (à compléter avec un chiffre)

4. Quel est ton niveau d'études? (à compléter avec un chiffre)

5. Quel est ton statut marital? (à compléter avec un chiffre)

6. Quel est ton lieu de naissance? (à compléter avec un chiffre)

7. Quel est ton lieu de résidence? (à compléter avec un chiffre)

8. Quel est ton mode de transport? (à compléter avec un chiffre)

9. Quel est ton mode de transport? (à compléter avec un chiffre)

10. Quel est ton mode de transport? (à compléter avec un chiffre)

11. Quel est ton mode de transport? (à compléter avec un chiffre)

12. Quel est ton mode de transport? (à compléter avec un chiffre)

13. Quel est ton mode de transport? (à compléter avec un chiffre)

14. Quel est ton mode de transport? (à compléter avec un chiffre)

15. Quel est ton mode de transport? (à compléter avec un chiffre)

16. Quel est ton mode de transport? (à compléter avec un chiffre)

17. Quel est ton mode de transport? (à compléter avec un chiffre)

18. Quel est ton mode de transport? (à compléter avec un chiffre)

19. Quel est ton mode de transport? (à compléter avec un chiffre)

20. Quel est ton mode de transport? (à compléter avec un chiffre)

Cartographie des aménagements

> octobre 2016



Action Pointe Aiguillon

Révision de l'APPB (**DREAL**)

Panneau information et orientation

Consultation

1^{ère} phase travaux

Comité de suivi Pointe 03

Suivi biologiques

Passereaux ONCFS

> information conseil municipal printemps 2017, validation automne 2017

> conception avec CDC au printemps 2017

> été 2017

> automne 2017 : abattage arbres ancien camping, retrait bloc bétons, pose ganivelles, etc.

> **novembre 2017**

> avril et mai 2016, suivis annuels



Actions

Nomenclature Life

Site

MO

Etat avancement

Ecologie Anatidés

A5 et A7

Baie et pourtour

ONCFS

Conforme au calendrier initial



Amélioration des connaissances en 3 axes :

1. Ressource alimentaire

Protocole modifié

Carottages effectués

Objectif : Analyse de 1512 carottes

> 270 carottes sur 4 sites (baie, préemiz, vacherie, lairoux)

> analyse courant 2017

2. Régime alimentaire

Réunion information chasseurs

Recueil gésiers

Objectif : Analyse de 100 gésiers

> mai 2016

> plus de 50 jabots



Amélioration des connaissances en 3 axes :

3. Distribution géographique

Acquisition émetteurs

Pose émetteurs en cours


Information site internet

Objectif : Capture et équipement de 15 sarcelles et 15 colverts

> fin 2016

> 5 colverts, 0 sarcelles, suite hiver 2018, plus de 40 d'ici la fin du programme

> à venir

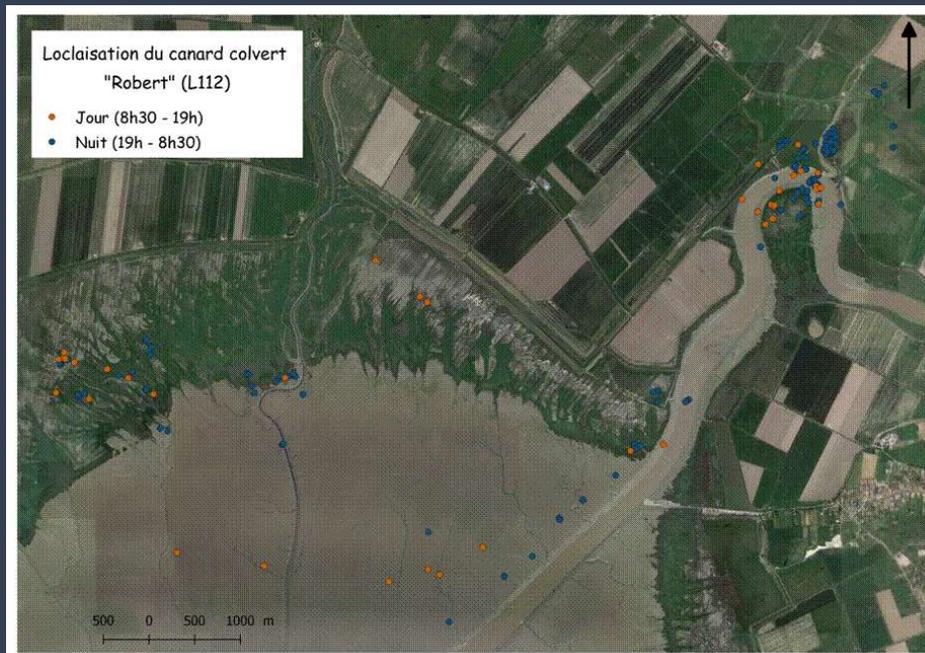

Monitoring

Comptage bimensuel

Comité de suivi

> Début en 2017 (octobre à mars)

> Courant 2017



Actions

Impact qualité eau sur biodiversité

Nomenclature Life

A6 et A7

Site

Baie et pourtour

MO

ONCFS

Etat avancement

Conforme au calendrier initial



Conventions partenariat

Conventions Ifremer EPMP ONCFS

> signées



Pérennisation stations mesures multi-paramètres


Acquisition 10 sondes *NKE instrumentation*

> 5 sites, 2 sondes par site

Evaluation production primaire

Prélèvement et analyse *LEAV*

> 8 sites toutes les 2 semaines

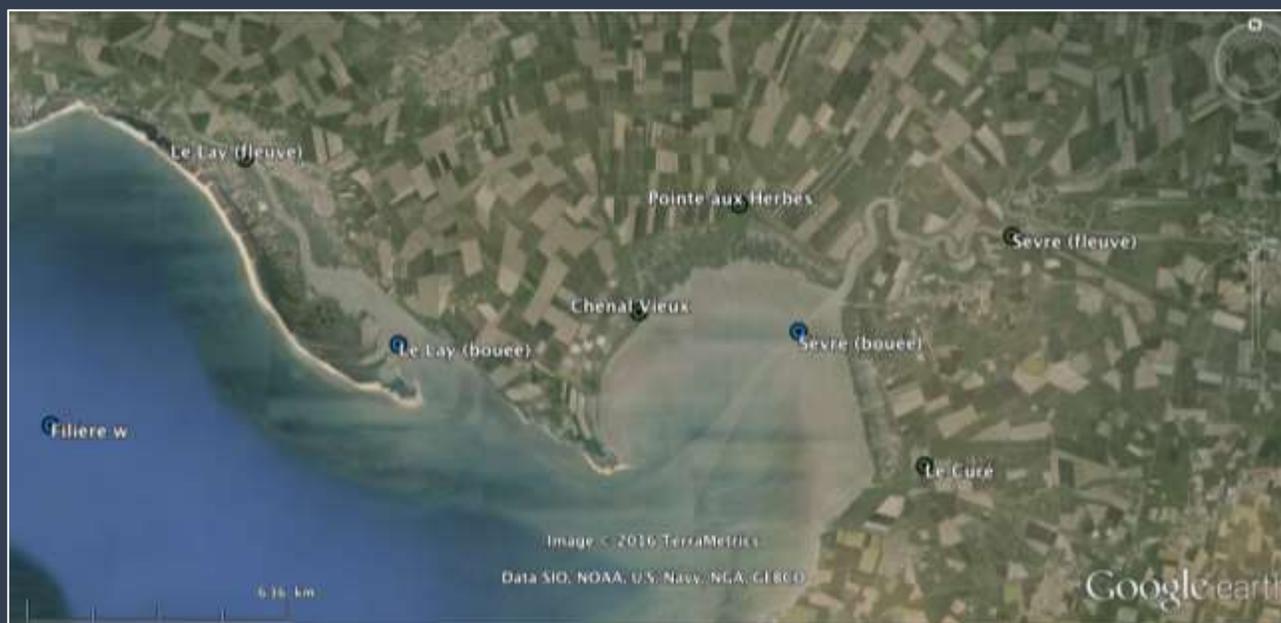

Conventions partenariat

Conventions Ifremer EPMP ONCFS

> signées



Pérennisation stations mesures multi-paramètres

Acquisition 10 sondes *NKE instrumentation*

> 5 sites, 2 sondes par site

Evaluation production primaire

Prélèvement et analyse *LEAV*

> 8 sites toutes les 2 semaines

Evaluation débits (hors life)

Débitmètres EPMP posés

> en février 2017 (Sèvre, le Curé, le Lay)

Comité de suivi

> à déterminer

Actions

Nomenclature Life

Site

MO

Etat avancement

Outils de sensibilisation et séminaires

E1, E2, E3, E4, E5 et E6

Baie et pourtour

PNR / ONCFS

Conforme au calendrier initial



Outils de communication

Film 12' LIFE 01

Pygargue Productions

> livraison juin 2017

Mission photo état 0

Phonic Lips

> livraison mai 2017

Livre illustré 1500 ex

Editions Hesse

> livraison octobre 2017 (festival Ménigoute)

Exposition LIFE

LPO/Centre Beautour

> Inauguration 08 mars 2017 (vernissage Centre Beautour)

Carnet de découverte

LPO

> Engagement printemps 2017, édition 2018


Site Internet et compte facebook

> depuis janvier 2016



<https://www.facebook.com/pg/lifebaieaiguillon>

<https://life.reserve-baie-aiguillon.fr>



Suivi presse et séminaires

Conférence de presse de lancement

Communiqué de presse

Interlife

Séminaire Réchauffement climatique 2018

Presse

> reportée à 3 reprises, annulée

> 22 février 2017

> rencontre annuelle des projets life (nov. 2016 Auzat)

> Groupe de travail dès le printemps 2017

> plus de 20 références dans la presse



Coordination

Actions

Coordination et suivi des 24 actions

Nomenclature Life

D5, F1, F2, F3 et F4

MO

PNR

Etat avancement

Conforme au calendrier initial



Coordination et suivi du projet

Evaluation des impacts socio-économique et écosystémique

Audit financier

Indicateurs CE projet

> retard d'engagement

> en 2018 et 2020

> renseignés en juin 2016

Gouvernance

Présentation projet

> 20

Comités (pilotage, technique, suivi)

> 14



Deadline transmission CE :
31 mars 2017 au plus tard

Des observations ?

Des corrections ?

 **LIFE BARGE**
Life Baie de l'Aiguillon
Préservation, restauration et valorisation des habitats d'intérêts européens de la baie de l'Aiguillon


LIFE14 NAT/FR/000669

PROGRESS REPORT 01
Covering the project activities from 01/01/2016 au 31/12/2016

Reporting date
31/03/2017


LIFE baie de l'Aiguillon

Data project

Project location	France
Project start date	01/01/2016
Project end date	31/12/2020
Total budget	2.317.727 €
EU contribution	1.390.637 €
(%) of eligible costs	100 %

Data beneficiary

Name Beneficiary	Parc naturel régional du Marais poitevin
Contact person	M. CHAIGNEAU Loïc
Postal address	2 rue de l'Eglise, 79510 COULON
Telephone	05.49.35.15.20
E-mail	Lchaigneau@parc-marais-poitevin.fr
Project Website	https://life.reserve-baie-aiguillon.fr

Calendrier

Exposition Beautour

08 mars 2017

Deadline envoi rapport traduit CE

24 mars 2017

Comité suivi Prée Mizottière 02

05 mai 2017

Comité suivi Crassat

20 juin 2017

Visite Neemo 02 Décembre 2017

24 au 26 juillet 2017

Comité suivi Eau

à définir

Comité suivi Anatidés

à définir

Comité suivi Pointe

nov. 2017 à définir

