COMPTE-RENDU
COMITE DE PILOTAGE 03 LIFE BAIE DE L'AIGUILLON

Date > **29 mars 2018**
Rédaction > Loic Chaigneau / Elise Chourré

Informations réunion

- Nature de la réunion — **Comité de pilotage Life Baie de l'Aiguillon (CoPil 03)**
- Date, heure — 08/03/2018, 14h30
- Lieu — PNR, Coulon
- Durée — 2h
- Réf. action — F1

Présents

- IIBSN — Gilles Chourré
- Conservatoire du Littoral — Jérôme Guével, Eric Perrin
- EPMP — Yoann Le Roy
- Chambre d'agriculture — Nadine Pelon
- DDTM Vendée — Jean-Philippe Vornière
- LPO — Ségolène Travichon, Olivia Mercier, Fréderic Corre,
- ONCFS — Emmanuel Joyeux
- Commune de Ste Radégonde — Paul Bournel
- Commune de St Michel en l'Herm — Michel Sagot
- CRC PC — Francis Bédis, Malory Beché
- PNR — Elise Chourré, Loïc Chaigneau, Dominique Giret

Excusés / absents

- SM Vendée Sèvre Autize, CDC biodiversité, Région Nouvelle Aquitaine, CC Sud Vendée Littoral, Commune de l'Aiguillon, DREAL Nouvelle Aquitaine, DREAL Pays de la Loire, Jean-Paul Rault, SMMPBL, DDTM Charente-Maritime, Parc marin

Pièce jointe

- Diaporama de présentation du comité de pilotage

1. EVOLUTION DU PLAN DE FINANCEMENT

Depuis son démarrage, plusieurs cofinanceurs contribuent au financement du programme LIFE Baie de l'Aiguillon : CDC Biodiversité Natura 2050, Région Nouvelle Aquitaine, SGAR Nouvelle Aquitaine, EPMP.

Financeurs	Montants €	%
EU	1 390 636	60%
MEEM	250 000	11%
PNR	321 264	14%
ONCFS	143 540	6%
LPO	212 287	9%
Total	**2 317 727**	**100%**

Financeurs	Montants €	%
EU	1 390 636	60.0%
MTES	250 000	10.8%
PNR	316 710	13.7%
ONCFS	127 236	5.5%
LPO	1	0.0%
CDC Biodiversité	119 579	5.2%
Région NA	53 475	2.3%
SGAR NA perçu	28 116	1.2%
SGAR NA sollicitation	27 974	1.2%
EPMP	4 000	0.2%
Total	**2 317 727**	**100%**

La Région des Pays de Loire a également été sollicité dans le cadre du projet restauration de vasières.

Les structures publiques telles que le PNR du Marais poitevin et l'ONCFS sont soumis à la règle des 102% dans le cadre des LIFE, c'est-à-dire qu'ils doivent apporter un autofinancement au projet équivalent aux coûts de personnel permanent (titulaire ou CDI) auxquels il faut ajouter 2%.


Les associations ne sont pas soumises à cette règle et peuvent prétendre à un autofinancement minimum.

2. PARTICIPATION FINANCIERE DU MTES

Le Ministère a récemment informé le PNR d'un défaut d'engagement de la convention de financement, signée par le Directeur de l'eau et de la biodiversité en date du 22 novembre 2016, en raison d'une erreur de procédure interne au MTES. Les dépenses réalisées et engagées de 2016 à aujourd'hui ne sont donc plus éligibles.
Le PNR a donc adressé un courrier au Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire pour dénoncer cette situation et en connaitre les raisons.
Toutefois, le Ministère, conscient de leur responsabilité, et le PNR recherchent une solution pour percevoir l'enveloppe initialement prévue.
Une nouvelle convention de 245 000 € pour les trois années restantes du programme est en cours d'élaboration. L'éligibilité des dépenses commencera à la date de signature de la convention. La participation du Ministère sera réduite à quelques actions et basée sur un taux de financement plus important.

3. ETAT D'AVANCEMENT DES DEPENSES

40% du temps imparti écoulé.
25% des dépenses réalisées au 31 décembre 2017.



4. ACTION : RESTAURATION DES HABITATS DE VASIERES

S'agissant des travaux d'enlèvement des structures conchylicoles abandonnées et des amas d'huitres, les études règlementaires, réalisées Créocéan, sont terminées (loi sur l'eau, étude d'incidences Natura 2000, évaluation au titre de travaux dans un site remarquable du littoral) et sont en cours

d'instructions par la DDTM17, qui centralise l'instruction (85 et 17). Les travaux sont désormais prévus à l'automne 2018, après la saison de production mytilicole.

L'étude relative à la faune benthique est réalisée (J. Jourde) et indique la présence d'une dizaine d'espèces exotiques présentes dans les crassats. De plus, sur préconisation de l'étude réglementaire et recommandation du Conseil scientifique de la RNN, une évaluation du risque de la remise en suspension de polluants en 2018 sera réalisée par la LPO (consultation en cours d'élaboration).

Les anciennes structures ostréicoles seront extraites et intègreront le circuit de traitement de déchets (tri, centre de stockage, recyclage…). En ce qui concerne les huitres, la difficulté du traitement réside dans le fait que ces déchets vont présenter de la matière vivante (nécessité d'une plateforme étanche).
Différentes méthodologies de recyclage seront testées et valorisées par la suite pour être utilisables dur le territoire.
La LPO travaille également sur le montage d'une filière de retraitement des déchets d'huîtres.

L'analyse des données topographiques de la baie de l'Aiguillon, réalisée par l'Université de La Rochelle, présente des conclusions intéressantes (très fort taux de sédimentation, avancée très rapide du trait de végétation). Cette étude est en ligne sur le site Internet du programme à l'adresse suivante : https://life.reserve-baie-aiguillon.fr/documents-a-telecharger

La lettre d'informations du programme « Chroniques estuariennes » présente cette action dans son 2ème bulletin publié le 11 sept. 2017. Elle est également téléchargeable sur le site du Life à la même adresse.

Remarques :

- J.P. Vornière : AOT nécessaire
- F. Corre : 4.5 hectares de concessions en linéaire ne sont plus exploitées. Les Autorisations d'Occupation Temporaire seront dénoncées sur cette zone.

5. ACTION : RESTAURATION DES HABITATS ESTUARIENS

Les aménagements hydrauliques (création d'une sortie à la mer au travers d'une digue et reprise d'un passage busé) ont été réalisés par l'UNIMA entre le 20 novembre et le 05 décembre 2017, après l'obtention de l'accord de la DDMT85. Une subvention de 4.000 € de l'EPMP a participé au financement de ces travaux. Une convention de délégation de maîtrise d'ouvrage signée entre le Conservatoire du Littoral et le PNR a permis la réalisation de ces travaux.

Cette convention permettra également au PNR de réaliser les travaux de déplacement de la digue, initialement prévus en 2019, en 2020. En effet, les travaux seront réalisés conjointement par le PNR et le SMVSA. Le calendrier de réalisation de ces différents travaux permet une mutualisation des moyens et une réduction des dépenses. Un marché à groupement de commandes sera réalisé par le PNR (digue LFE) et le SMVSA (digues PAPI).

Le cahier des charges relatif au marché de maîtrise d'œuvre est actuellement en cours d'élaboration. Les éléments techniques seront présentées à la DDTM (fin avril) qui précisera les études nécessaires à l'instruction réglementaire (étude d'impact, étude de danger, modélisation hydraulique, étude Loi sur l'Eau, inventaire des espèces protégées, inventaire géotechnique, étude technique comprenant l'étude géotechnique). Le marché public de maîtrise d'œuvre sera publié au printemps 2018, après

avis des services de l'Etat. L'évolution du calendrier de mise en œuvre de cette action a été validée par l'Europe en mai 2017.

De plus, le Conservatoire du Littoral et le PNR vont rencontrer en avril 2018 RTE pour discuter du devenir du pylône situé en arrière de la digue actuelle.

Enfin, l'emplacement de la plateforme est conditionnée au positionnement des futures zones d'emprunt nécessaires à la réfection des digues PAPI qui seront définis à l'automne 2018.

Remarques :
Une dissociation des deux projets sera envisageable si le projet relatif aux digues PAPI est retardé.

6. ACTION : PRESERVATION ET RESTAURATION DES MILIEUX DUNAIRES

Une première tranche de travaux de préservation des habitats dunaires sera réalisé en 2018 par le PNR (pose de ganivelles et de fils lisses), une seconde tranche de travaux (abattage des arbres et nettoyage blocs béton) à l'automne 2018. . L'étude d'incidences Natura 2000 simplifiée a été réalisée. Toutes les autorisations ont été obtenues et transmises au PNR pour la réalisation des travaux, notamment l'Autorisation d'Occupation Temporaire délivrée par la Préfecture.

Le panneau de sensibilisation, présentant l'APPB de la Pointe de l'Aiguillon et ses habitats, est posé depuis le 24 février 2018, après un travail en commun avec la DREAL PL et la communauté de communes Sud Vendée Littoral. Le panneau a été posé par la commune de l'Aiguillon sur Mer.

7. ACTION : ANATIDES

Ressources alimentaires (objectif de 1512 carottes sur la globalité du programme)
La première campagne de carottages d'échantillonnage de sols a permis de recueillir 4 050 carottes de sols, tamisées et étuvées. La seconde campagne est engagée. Les analyses de ces carottes seront effectuées en 2019 par un prestataire spécialisé, engagé par l'ONCFS.

Régime alimentaire
Bonne participation des chasseurs pour la récolte des gésiers, 69 gésiers recueillis. Une synthèse des analyse sera produite en 2018.

Distribution géographique
Saison 2017-2018 : 6 Canards colverts équipés d'émetteurs, 5 Sarcelles d'hiver et 3 Canards pilets.
Une cartographie des déplacements des canards est régulièrement actualisée (tous les 10-15 jours) en période de suivi sur le site et le Facebook du LIFE Baie de l'Aiguillon.

Remarques :
Les travaux d'aménagements hydrauliques réalisés sur le site de la Prée Mizottière ont facilité la capture des canards. Il semble que les anatidés se nourrissent davantage sur les prés salés.

8. ACTION : IMPACT DE LA QUALITE DE L'EAU SUR LA BIODIVERSITE

L'objectif principal consiste à mieux appréhender les relations hydrauliques entre la Baie de l'Aiguillon, le Marais poitevin et son bassin versant. Cet objectif a été présenté aux membres du Conseil scientifique de la RNN de la Baie de l'Aiguillon le 21 mars 2017 à Luçon, afin de valider la mise en œuvre de l'action. De plus, le comité de pilotage s'est réuni le 05 juillet 2017 et a permis de préparer la saison 2017/2018.

S'agissant des mesures de la qualité physico-chimique des eaux, les sondes sont opérationnelles depuis février 2017 dans la baie et son pourtour immédiat, placées sur les 5 sites initialement prévues (Chenal Vieux, canal de Luçon, canal de la Raque, estuaire de la Sèvre niortaise, canal du Curé). Deux sondes sont acquises par site, utilisées alternativement (entretien matériel).

S'agissant de la compréhension des facteurs influençant la production primaire, des mesures physico-chimiques sont réalisées à raison d'un prélèvement par bateau (LEAV), toutes les 2 semaines aux différents exutoires depuis janvier 2017. Les éléments mesurés permettront de comprendre les facteurs influençant la production primaire. Compte-tenu des turbidités élevées de l'eau, l'analyse de la flore totale, prévue initialement, s'avère très difficile. Les moyens en jeu conduisent à travailler préférentiellement sur les concentrations de chlorophylle a. Une analyse de la flore totale pourra peut-être être réalisée en deuxième année en fonction des résultats obtenus sous réserve de faisabilité technique (en 2018 à priori).

Une présentation des premiers résultats a été effectuée le 27 juin 2017 aux principaux acteurs hydrauliques (SAGE, Syndicats Mixtes, Conseil Départemental 85) afin de permettre une discussion critique, ainsi qu'aux aux membres de la CLE du SAGE Sèvre Niortaise le 18 septembre 2017.

Cette est présentée dans le premier bulletin de la lettre d'info du LIFE Baie de l'Aiguillon « Chroniques Estuariennes » en juillet 2017.

Remarques :

- G. Chourré : L'IIBSN va déposer début avril un dossier de déclaration de travaux auprès de l'administration de Charente-Maritime, relatif au dragage de la Sèvre et du canal maritime en fonds d'estuaire (période 2019-2028). Cette opération comprend des mesures de suivis :
  - annuelles pour vérifier la qualité des sédiments (HAP, PCB, métaux, coliformes, écotoxicité)
  - régulières en phases de travaux pour le suivi de la turbidité, MES, salinité, O2, .."

  S'agissant des mesures de suivi en phase travaux, l'IIBSN souhaiterait s'appuyer sur les dispositifs de mesures déjà en place ou installés dans le cadre du LIFE. Des compléments peuvent être envisagés par l'IIBSN, dès 2019 ou bien à l'issue du programme LIFE (station d'acquisition automatique ou prestation labo. départementaux, ...).
- F. Corre et M. Joyeux : l'équipe projet du LIFE partage le souhaite de Gilles, une réflexion commune est à engager.

9. SENSIBILISATION ET COMMUNICATION

Plusieurs outils de communication et de sensibilisation ont été réalisés au cours des deux premières années du programme : une plaquette d'information du programme LIFE Baie de l'Aiguillon, une exposition photographique à la disposition des communes et des partenaires (créée en partenariat avec le Centre Beautour), un livre illustré, un film sur les habitats naturels de la baie de l'Aiguillon, un reportage photographique, un suivi des événements « presse », les lettres d'informations « Chroniques estuariennes » régulièrement publiées, la pose d'un panneau de sensibilisation à la Pointe de

l'Aiguillon (créé en partenariat avec la Communauté de communes Sud Vendée Littoral), un site Internet dédié au programme, un compte facebook également dédié au programme, et enfin un carnet de découverte en cours de finalisation à destination du public scolaire.
De plus, une soirée dédiée au programme s'est tenue le 10 novembre 2017 à l'Aiguillon sur Mer (plus de 100 personnes présentes).

Le premier colloque du programme, qui porte sur les conséquences du réchauffement climatique sur les marais littoraux, se tiendra à l'Espace Encan de La Rochelle les 27, 28 et 29 novembre 2018. Un groupe de travail constitué du PNR et du Forum des Marais Atlantiques engage l'organisation de ce colloque.

10. COORDINATION

L'évaluation des services écosystémiques fournis par les sites avant et après les actions LIFE réalisées sera engagée en 2018 par le PNR en partenariat avec la LPO, qui dispose de ressources humaine et technique ad hoc.
Le rapport d'activités du programme Life sera adressé à la commission européenne avant le 31 mars 2018.

Baie de l'Aiguillon

Comité de pilotage 03

Coulon > 08 mars 2018

Rappel > Fiche d'identité du projet

Objet

« Préservation, restauration et valorisation des habitats d'intérêt européen de la baie de l'Aiguillon »

Durée	Coordinateur	Associés	Budget
2016 – 2020	Parc naturel régional du Marais poitevin	Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage; LPO; AGIR pour la BIODIVERSITÉ	2.317.727 €

Financeurs

Parc naturel régional du Marais poitevin; Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage; LPO; AGIR pour la BIODIVERSITÉ; Life; Natura 2000; Ministère de la Transition écologique et solidaire; Préfet de la Région Nouvelle-Aquitaine; Région Nouvelle-Aquitaine; Région Pays de la Loire; cdc biodiversité; Nature 2050; Etablissement public du Marais poitevin

Rappel > Fiche d'identité du projet

Comprendre, restaurer et partager l'écosystème de la baie de l'Aiguillon



Baie de l'Aiguillon

> Restauration d'environ 100 ha de vasières



Prée Mizottière

> Restauration d'environ 10 ha de prés salés et 15 ha de prairies paturées



Pointe de l'Aiguillon

> Protection de 12 ha de milieux dunaires




Etudes Interactions Baie/Marais

> Etude anatidés et Etude eau



Sensibilisation du public


> Colloques et outils de communication

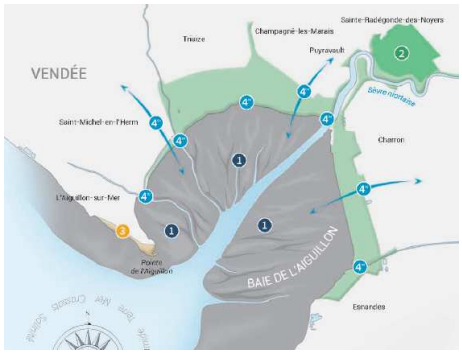

Evolution du plan financement


Plan financement initial (dépôt : oct. 2014)

Financeurs	Montants €	%
EU	1 390 636	60%
MEEM	250 000	11%
PNR	321 264	14%
ONCFS	143 540	6%
LPO	212 287	9%
Total	**2 317 727**	**100%**

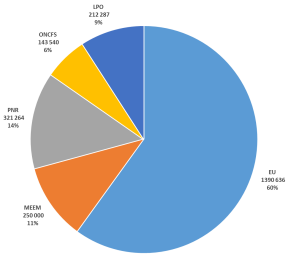

Plan financement mars 2018

Financeurs	Montants €	%
EU	1 390 636	60.0%
MTES	250 000	10.8%
PNR	316 710	13.7%
ONCFS	127 236	5.5%
LPO	1	0.0%
CDC Biodiversité	119 579	5.2%
Région NA	53 475	2.3%
SGAR NA perçu	28 116	1.2%
SGAR NA sollicitation	27 974	1.2%
EPMP	4 000	0.2%
Total	**2 317 727**	**100%**

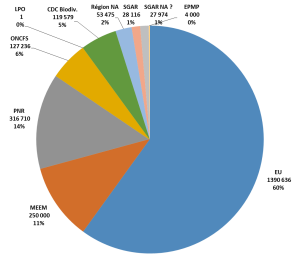

4

Accords et recherche de financement

Europe	Grant Agreement du 23 novembre 2015	> 1 390 636 €
Région NA	Convention du 9 août 2016	> 53 475 € : LPO
Ministère TES	Convention du 22 novembre 2016	> 250 000 €
SGAR NA	Arrêtés du 15 décembre 2016	> 25 595 € : LPO (19 711 € perçus) > 8 405 € : ONCFS
CDC Biodiversité	Convention du 15 décembre 2016	> 119 579 € : LPO
EPMP	Convention du 12 décembre 2017	> 4 000 € : PNR
Financement en attente	> Région Pays de Loire (LPO) > SGAR NA (LPO, ONCFS, PNR)	

5

Plan financement : participation du ministère

Participation financière du MTES


- MTES : participation de 250 000 €
- Convention signée par le Directeur de l'eau et de la biodiversité en date du 22 novembre 2016
- **Convention non « engagée » par le** MTES : défaut de procédure interne au MTES, dépenses réalisées et engagées en 2016 et 2017 non éligibles

➢ **Courrier du PNR au MTES**

➢ **Echanges techniques avec le MTES**

6


Etat d'avancement des dépenses



> 40% du temps imparti écoulé

	Etat d'avancement		
	Budget initial	Dépenses réalisées au 31/12/2017	%
	2 317 728 €	**579 342 €**	**25%**
Restauration - Habitats de vasières - Baie de l'Aiguillon	605 965.61	73 989.81	**12%**
Restauration - Habitats estuariens - Prée Mizottière	411 119.68	35 101.88	**9%**
Préservation - Habitats dunaires - Pointe de l'Aiguillon	124 886.12	11 824.69	**9%**
Etudes Anatidés & Eau	435 569.18	244 775.46	**56%**
Sensibilisation et diffusion des résultats	462 525.69	104 903.43	**23%**
Coordination	277 661.79	108 746.28	**39%**

> 25 % des dépenses réalisées



Etat d'avancement des actions

Volets d'actions

- > Restauration des habitats de vasières
- > Restauration des habitats estuariens
- > Préservation et restauration des milieux dunaires
- > Actions anatidés et eau
- > Sensibilisation et communication
- > Coordination

Restauration des habitats de vasières

Action	Restauration des vasières et monitoring
Nomenclature Life	A1, C1, D1
Site	Baie de l'Aiguillon
MO	LPO
Etat avancement	Conforme au calendrier initial



Restauration des habitats de vasières

Travaux d'enlèvement des structures conchylicoles abandonnées et des amas d'huitres

- **Instructions réglementaires** (Créocéan) > finalisées, attente autorisation DDTM



Processus de développement des huitres sauvages sur les anciennes structures de conchyliculture

- **Détermination des espèces et habitats présents avant les travaux**
  Inventaire de la macrofaune benthique, analyses granulométriques des sédiments, mesures de la matière organique (J. Jourde)
  > réalisés (rapport final courant 2018)




- **Traitement des déchets** > prise en charge partielle (Batyrecyclage) et remise en suspension
- **Conseil scientifique RNN** > Evaluation du risque de la remise en suspension de polluants en 2018

Restauration des habitats de vasières

Travaux d'enlèvement des structures conchylicoles abandonnées et des amas d'huîtres

- **Consultation travaux** > Réalisée à l'été 2017, prestataire identifié
- **Professionnels rencontrés le 19 sept. 2017**
- **Date travaux** > printemps 2018
- **Enveloppe financière complémentaire >** GALPA ???

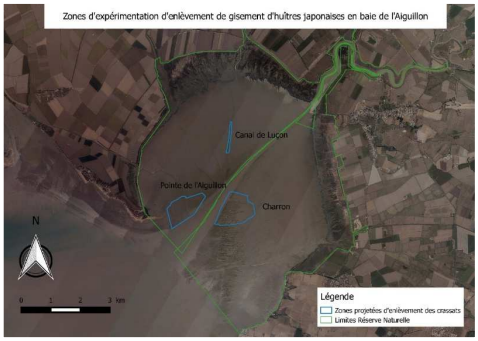


Restauration des habitats de vasières

Monitoring

- **Analyse des données topographiques de la baie de l'Aiguillon**
  > Université de La Rochelle

  > zone présentant de **très fort taux de sédimentation**
  soit 1,4 ± 0,5 cm/an de 2000 à 2016

  > une **avancée très rapide du trait de végétation**
  soit de 6,3 ± 0,3 m/an depuis 1972

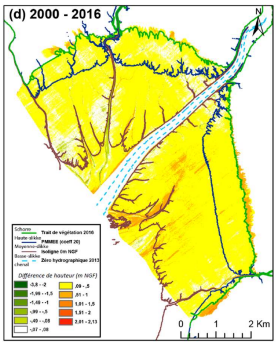

Budget sédimentaire de la Baie de l'Aiguillon par Laser aéroporté

4,7 +/- 1,6 millions de m³
en 16,4 ans (2000-2016)

Environ 285 000 m³ / an

+1,4 +/- 0,5 cm/an en moyenne

Jonathan Blanloeil
Eric Chaumillon
UMR CNRS 7266 LIENSs
Université de La Rochelle


Informations

- « Chroniques estuariennes n°2 »
  publiée le 11 sept. 2017



Restauration des habitats estuariens

Action	Restauration de prés salés, de prairies pâturées et monitoring
Nomenclature Life	A3, C3, D3 et E7
Site	Ferme de la Prée Mizottière
MO	PNR
Etat avancement	Calendrier initial modifié

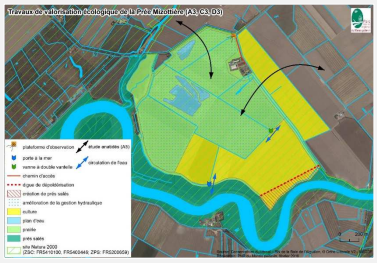

Restauration des habitats estuariens

Aménagements hydrauliques

- Oct. 2017 : **Accord DDTM85**
- Oct. 2017 : Accord de subvention de l'EPMP (4.000 €) pour le financement de ces travaux
- 20/11 au 05/12/2017 : **Travaux réalisés** par l'UNIMA
- Coût travaux : supérieur de 5.000 € aux 20.000 € initialement prévus





Restauration des habitats estuariens

Déplacement de la digue

- **Comité de suivi** > 09 octobre 2017
- **Rehausse de la digue seconde** > Convention de superposition d'affectation entre SMVSA et le CDL signée
- **Zones d'emprunts** > Définition après la réalisation de l'étude géotechnique (été 2018)
- **Comité consultatif de la Réserve naturelle** > 25 janvier 2018
- **Pylône RTE (convention de servitude CDL/RTE)** > Rencontre en mars 2018





Restauration des habitats estuariens

Déplacement de la digue

- **Convention de délégation de maîtrise d'ouvrage** signée entre le CDL et le PNR
- **Elaboration d'un marché à groupement de commandes** (PNR et SMVSA coordonnateur) en cours

  En cours > Rédaction du cahier des charges par le SMVSA pour études et maîtrise d'œuvre

  Mars 2018 > Transmission pour avis à la DDTM 85

  Juillet 2018 > Engagement des études

  Sept. 2020 > Début des travaux

➢ **Calendrier modifié en conséquence**

Restauration des habitats estuariens

Plateforme observation

- **Conditionnée au positionnement des futures zones d'emprunt** nécessaires à la réfection des digues PAPI
- **Automne 2018** : Définition (type, cheminement, gestion, etc.) et engagement d'une consultation (CCP)

Autres sujets

- **Rencontre DREAL Pays de la Loire** > 24 nov. 2017
- Communication > Une vidéo « recul des digues » ?
- **Prochain comité de suivi** > avril 2018

Préservation et restauration des milieux dunaires

Action	Préservation et restauration des milieux dunaires et monitoring
Nomenclature Life	A4,C4 et D4
Site	Pointe de l'Aiguillon (APPB)
MO	PNR
Etat avancement	Conforme au calendrier initial



Préservation et restauration des milieux dunaires

Autorisations administratives

- **Autorisation d'occupation temporaire** pour pose de ganivelles/fils lisses > ok
- **Etudes incidences N2000** pour les travaux (ganivelles/fils lisses, abattage des arbres et nettoyage blocs béton) > ok



Travaux

- Consultation réalisée en janvier 2018
- Première tranche de travaux **mi-mars 2018**

Préservation et restauration des milieux dunaires

Panneau de sensibilisation (action E1)

- Posé le 24 février 2018



Révision de l'APPB Pointe de l'Aiguillon

- Rencontre DREAL > **révision avant la fin du LIFE**

Suivis biologiques

- Gravelot à collier interrompu, Gorge bleue à miroir et Pipit rousseline ; passereaux des buissons et alaudidés suivis également (non prévus initialement)
- Cartographie des habitats : 2019

Action anatidés


Actions	Ecologie Anatidés
Nomenclature Life	A5 et A7
Site	Baie et pourtour
MO	ONCFS
Etat avancement	Conforme au calendrier initial




Action anatidés

Ressource alimentaire

- **1er campagne réalisée** : 4 050 carottes de sols, tamisées, étuvées, analyse à venir
- **2ème campagne engagée** : carottages d'échantillonnage du sol des prairies en cours











Régime alimentaire

- Réunion d'information auprès des chasseurs vendéens le 02/11/ 2017
- 69 gésiers recueillis par les chasseurs
- Synthèse des analyses produite en 2018






Action anatidés

Distribution géographique

pour la saison 2017-2018

- Canards colverts > 6 émetteurs
- Sarcelles d'hiver > 5 émetteurs
- Canards Pillets > 3 émetteurs

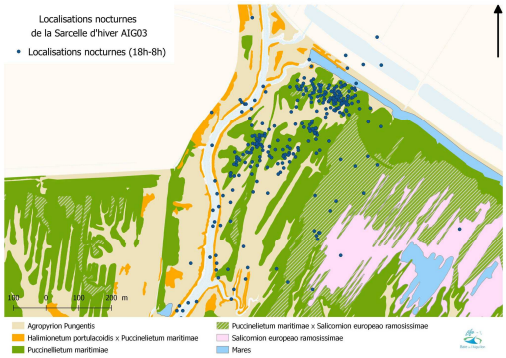

Site internet

- **Cartographie** des déplacements des canards actualisée régulièrement (tous les 10-15 jours) en période de suivi
- Actualité relayée sur le site et le Facebook du LIFE Baie de l'Aiguillon

Suivi bimensuel des anatidés

- Réalisé de novembre 2017 à mars 2018

Action eau > Impact de la qualité de l'eau sur la biodiversité

Actions	Impact qualité eau sur biodiversité
Nomenclature Life	A6 et A7
Site	Baie et pourtour
MO	ONCFS
Etat avancement	Conforme au calendrier initial



Action eau > Impact de la qualité de l'eau sur la biodiversité

Conseil scientifique RNN

- 21 mars 2017 : Action présentée aux membres du **Conseil scientifique de la RNN** de la Baie de l'Aiguillon

Ifremer


Etablissement public du Marais poitevin

Comité de pilotage

- 05 juillet 2017 : PNR, LPO, ONCFS, IFREMER et EPMP

Mesure de la qualité physico-chimique des eaux

- Sondes opérationnelles depuis février 2017 dans la baie et son pourtour immédiat (5 sites)



Action eau > Impact de la qualité de l'eau sur la biodiversité

Compréhension des facteurs influençant la production primaire


- Mesures physico-chimiques (LEAV), toutes les 2 semaines (en moyenne), aux différents exutoires
- Analyse de la flore totale difficile (turbidité eau) > concentrations de chlorophylle a
- Analyse de la flore totale en 2ème année en fonction des résultats obtenus sous réserve de faisabilité technique

Action eau > Impact de la qualité de l'eau sur la biodiversité



Présentation des premiers résultats

- 27 juin 2017 : principaux acteurs hydrauliques (SAGE, Syndicats Mixtes, CD 85)
- 18 sept. 2017 : membres de la Commission Locale de l'Eau du Schéma d'Aménagement et de Gestion de l'Eau de la Sèvre Niortaise



Communication

- « Chroniques estuariennes n°1 » publiée en juillet 2017



Sensibilisation et communication

Actions	Sensibilisation et communication
Nomenclature Life	E1, E2, E3, E4, E5 et E6
Site	Baie et pourtour
MO	PNR, ONCFS, LPO
Etat avancement	Conforme au calendrier initial


Sensibilisation et communication

- > Plaquette
- > Exposition
- > Livre
- > Film
- > Reportage photographique
- > Suivi presse
- > Lettres d'info
- > Panneau Pointe Aiguillon
- > Site internet
- > Compte Facebook
- > Carnet de découverte (en cours)





























Sensibilisation et communication

Soirée LIFE

- Plus de 100 personnes présentes (grand public, élus, partenaires…)



Colloque LIFE 01 > Colloque Changement climatique

- Mutualisation avec le Forum des Marais Atlantiques (commande AELB)
- Mise en place d'un groupe de travail : FMA –PNR – E. Chaumillon
- Espace Encan La Rochelle > **27, 28 et 29 novembre 2018**



Panneaux de chantier LIFE

- Pose avril 2018







Coordination

Actions	Coordination et suivi des 24 actions
Nomenclature Life	D5, F1, F2, F3 et F4
MO	PNR
Etat avancement	Conforme au calendrier initial

Coordination

Evaluation des services écosystémiques fournis par les sites avant et après les actions réalisées

- Partenariat avec Marion Grassi LPO Rochefort, Module « littoral » de l'outil Tessa (Birdslife) à venir, report de la sortie de l'outil
- Création du comité technique
- Avril 2018 : début des rencontres des acteurs du territoire par groupe / animation LPO si validation PNR

Plan après life > en 2020

Audit financier > en 2018 et 2020

Indicateurs > en cours

Rapport de progrès 02

Transmission CE : 31 mars 2018 au plus tard

- **Des observations ?**
- **Des corrections ?**



LIFE BARGE
Life Baie de l'Aiguillon
Préservation, restauration et valorisation des habitats d'intérêts européens de la baie de l'Aiguillon

LIFE14 NAT/FR/000669

PROGRESS REPORT 02
Covering the project activities from 01/01/2017 au 31/12/2017

Reporting date
31/03/2018

LIFE baie de l'Aiguillon

Data project

Project location	France
Project start date	01/01/2016
Project end date	31/12/2020
Total budget	2.317.727 €
EU contribution	1.390.637 €
(%) of eligible costs	100 %

Data beneficiary

Name Beneficiary	Parc naturel régional du Marais poitevin
Contact person	M. CHAIGNEAU Loic
Postal address	2 rue de l'Eglise, 79510 COULON
Telephone	05.49.35.15.20
E-mail	lchaigneau@parc-marais-poitevin.fr
Project Website	https://life.reserve-baie-aiguillon.fr

FIN

Merci de votre attention !

Life
Baie de l'Aiguillon

